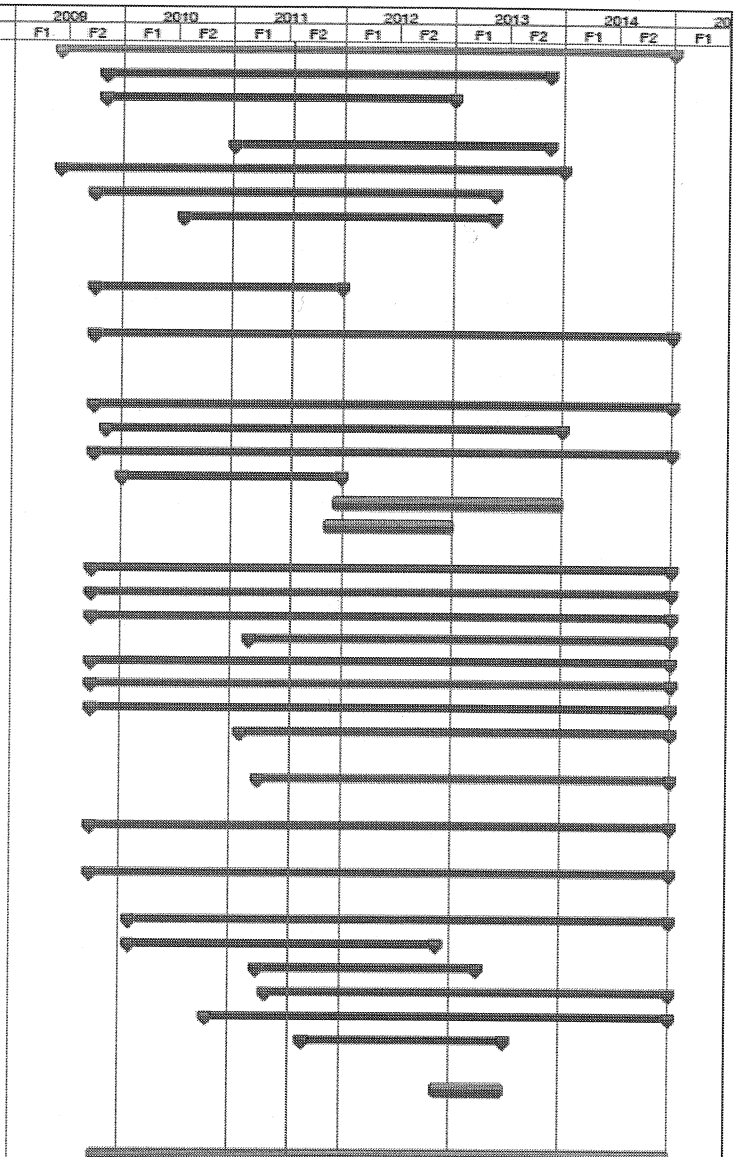Azonosító	WBS	Tevékenység neve	Készültség	Kezdés	Befejezés
0	0	LP	19%	2009.06.08.	2014.12.31.
1	1	Gazdasági és finanszírozási csoport	14%	2009.11.04.	2013.11.13.
2	1.1	Finanszírozási koncepció és üzleti modell kidolgozása	18%	2009.11.04.	2012.12.31.
24	1.2	Projekttársaság megalapítása	10%	2011.01.03.	2013.11.13.
29	2	Tender kiírás és tender értékelés előkészítése, értékelés	7%	2009.06.08.	2013.12.31.
57	3	Műszaki elemzési feladatok	50%	2009.10.01.	2013.05.15.
58	3.1	Az Országgyűlési döntést előkészítő minisztériumi előterjesztés indoklásában szereplő vizsgálatok végrehajtása	41%	2010.07.20.	2013.05.15.
74	3.2	Megvalósíthatósági vizsgálat a paksi bővítés hűtési megoldásaira	59%	2009.10.01.	2011.12.29.
86	4	Engedélyezés	13%	2009.10.01.	2014.12.31.
87	4.1	Engedélyezés előkészítése, végrehajtása	13%	2009.10.01.	2014.12.31.
88	4.1.1	A környezetvédelmi engedélyezés	17%	2009.11.09.	2013.12.31.
97	4.1.2	Telephely engedélyezés	6%	2009.10.01.	2014.12.31.
104	4.1.3	Dózismegszorítás megállapítása	39%	2010.01.01.	2011.12.29.
114	4.1.4	Hatósági díjak	0%	2011.12.01.	2013.12.31.
115	4.1.5	EURATOM 37. cikkely szerinti tájékoztatás előkészítése	0%	2011.11.01.	2012.12.31.
116	5	Jogi feladatok	28%	2009.09.25.	2014.12.31.
117	5.1	Munkacsoportok tevékenységeinek támogatása	20%	2009.09.25.	2014.12.31.
118	5.1.1	Engedélyezési feladatokhoz jogi támogatás	33%	2009.09.25.	2014.12.31.
122	5.1.2	Tenderkiírással kapcsolatos feladatokhoz jogi támogatás	6%	2011.03.01.	2014.12.31.
127	5.1.3	Kommunikáció jogi támogatása	0%	2009.09.25.	2014.12.30.
129	5.2	Belső jogi feladatok	42%	2009.09.25.	2014.12.31.
134	6	Társadalmi elfogadás, lakossági kommunikáció	26%	2009.09.25.	2014.12.30.
135	6.1	A társadalmi elfogadottság folyamatos magas szinten tartása	41%	2011.02.01.	2014.12.30.
199	6.2	A lakosság tájékoztatása az atomerőmű működésével, céljaival, előnyeivel kapcsolatban	10%	2011.04.01.	2014.12.30.
227	6.3	A dolgozói elkötelezettség, elhivatottság erősítése az MVM Társaságcsoportban	36%	2009.09.25.	2014.12.30.
240	6.4	Rendezett kapcsolat kiépítése a civil, valamint az antinukleáris szervezetekkel	21%	2009.09.25.	2014.12.30.
250	7	Regionális és térségi kapcsolati rendszer	10%	2010.02.01.	2014.12.30.
251	7.1	A térségi humánerőforrás bevonása	13%	2010.02.01.	2012.11.15.
288	7.2	Humánerőforrás-logisztika	0%	2011.03.31.	2013.03.29.
313	7.3	A térségi vállalkozások bevonása	31%	2011.04.30.	2014.12.30.
329	7.4	Térség-, település- és vállalkozásfejlesztés	16%	2010.10.15.	2014.12.30.
346	7.5	A Különleges Fejlesztési Övezet státuszára vonatkozó jogszabályok előkészítése	0%	2011.08.30.	2013.08.28.
351	7.6	Összefoglaló tanulmány készítése "Az új paksi blokkok létesítésének közép és hosszú távú hatása a térség társadalmi és gazdasági életére" címmel	0%	2012.10.31.	2013.08.28.
352	8	Projektirányítás támogatása	34%	2009.09.25.	2014.12.31.
